

आज मिति २०८१ भाद्र ५ र ६ गतेका दिन यस छात्राई ताडसोड गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री सेनाड गुरुड ज्यु को अध्यक्षतामा देहाय बमोजिमको उपस्थितिमा आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को वार्षिक कार्यक्रमहरुको समिक्षा गोष्ठी संचालन गरि सुसम्पन्न गरियो ।

उपस्थिति:

क्र सं	नाम थर	पद	२०८१।५।५ गते	२०८१।५।६ गते
१	सेनाड गुरुड	अध्यक्ष		
२	राममण्डल श्रेष्ठ	४ नं. वडा अध्यक्ष		
३	अमरराज सेजुवाल	प्र. प्र. भ.		
४	मणिराज पांडे	या. अ. तथा त. शा. प्रमुख		
५	बम बहादुर श्रेष्ठ	पूर्वाधार विकास शाखा प्रमुख		
६	शक्त बहादुर कुवा	प्रशासन तथा वि. शाखा प्रमुख		
७	राम बहादुर श्रेष्ठ	सि. शा. प्रमुख		
८	प्रेमशंका कुमारी जोशी	बालिका तथा खेलकुद शाखा		
९	बालिका शौली शर्मा	महिला, बाल-बालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा		
१०	शोभा कु. जोशी	आ. शा. प्रमुख		
११	कल्पना कु. शर्मा	संसाधन शाखा		
१२	सुनिता ठकुरलला	आ. शा. प्रमुख		

94	श्रीमच्छंका बुढा	नेत्रपाल	श्रीमच्छंका	श्रीमच्छंका
95	आय्या के वि. शोका	पोखरा	आय्या	आय्या
96	तुल वसुदेव शर्मा	अ.स.ई	तुल	तुल
97	पुष्पा १९६१	अ.स.ई	पुष्पा	पुष्पा
98	लक्ष्मी शर्मा	EDF	लक्ष्मी	लक्ष्मी
99	आली (रा) वि. उ	अ.स.ई	आली	आली
100	पविना धरना	H.A	पविना	पविना
101	शान्ति बुढा	राजार	शान्ति	शान्ति
102	सुमिता कुमारी महतारा	अमिन	सुमिता	सुमिता
103	मञ्जु वडु	अ.स.ई	मञ्जु	मञ्जु
104	लैकी गुरुङ	स.ई	लैकी	लैकी
105	देवतारायण भट्टराई	प.स.ई	देवतारायण	देवतारायण
106	शकविर के. शर्मा	पा.स.ई	शकविर	शकविर
107	शैशीला शिवा	प.स.ई	शैशीला	शैशीला
108	बुद्धि व. धर	अ.स.ई	बुद्धि	बुद्धि
109	अद्वैत शिवा	व.स.ई	अद्वैत	अद्वैत

छार्का ताडसोड गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
कागकोट, डोल्पा

आ. व. २०८०।०८१ को वार्षिक समिक्षा गोष्ठी

गोष्ठी संचालन मिति: २०८१ भाद्र ५ र ६ गते

प्रस्तुतकर्ता: मणिराज पौडेल

पद: योजना, अनुगमन तथा तथ्याडक शाखा प्रमुख

क्र सं	कार्यक्रम	स्थान	विनियोजन	भुक्तानी	प्रगति	सामना गरिएका समस्याहरु	समाधानका उपायहरु	सम्पादन गरिएका असल अभ्यासहरु
१	छार्का भेरी नदी तटबन्धन	वडा नं १						
२	१ नं वडा कार्यालय भवन निर्माण	वडा नं १	५००००००					
३	कागकोट देखि भारबुङ सडक निर्माण	वडा नं ४	१५००००००	१७३५१०२।४१	31.52			
४	कागकोट भेरी नदी तटबन्धन निर्माण	वडा नं ४	१०००००००	२६४५६६०।६४	61.88			
५	आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भवन निर्माण	वडा नं ५	५००००००	३६९७४९७।२६	99.58			
६	फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि डम्पिङ	वडा नं ४	९००००००	२४२७९०२।७२	57.50			
७	गाउँपालिका प्रशासकीय भवन निर्माण	वडा नं ४						
८	गाउँपालिका बाटो तटबन्धन निर्माण योजना	वडा नं २	१५००००००	०	०			
९	नेउडदेखि लाप्चे सम्म सडक मर्मत योजना	वडा नं १	४००००००	२०३८६०९	50.97			
१०	ठिमेरदेखि दोस्या सम्म बाटो मर्मत	वडा नं २	६५००००	६०९१००	93.71			
११	चाडचुङ खोला ग्याविन निर्माण	वडा नं १	१५०००००	१४३११८४	95.41			
१२	टालाडदेखि गापी डल्सोसम्म बाटो मर्मत	वडा नं ३	६५००००	६१७२७९	94.97			
१३	लाडगुकदेखि डुखुडसम्म कृषि सडक निर्माण	वडा नं १	४००००००	२५२१७१०	63.04			
१४	जेष्ठ नागरिक कोरा निर्माण	वडा नं १	६५००००	६०५७५०	93.19			
१५	काबु सिंचाई कूलो निर्माण	वडा नं ४	६५००००	६०७८००	93.51			
१६	डाक्लोवादेखि थैलाडजा मेरीसम्म गोरेटो बाटो निर्माण	वडा नं ५	६५००००	६१२०००	94.15			
१७	चडखादेखि फोलुन देमी सम्म सडक मर्मत	वडा नं ६	६५००००	६१२८००	94.28			



छार्का ताडसोड गाउँपालिका

प्रशासन तथा जिन्सी शाखा

आ. व. २०८० | ०८१ को बार्षिक समिक्षा बैठक

२०८१ साल भाद्र ५ र ६ गते

आयोजक

छार्का ताडसोड गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, कागकोट, डोल्पा
कर्णाली प्रदेश

कार्यालयको लागि मसलन्द

१. कार्यालयको लागि मसलन्द खरिद:
विनियोजन रकम रु २००००००० ।

कर्णाली इनर्जी एण्ड स्टेशनरी, एपी
स्टेशनरी, न्यु त्रिपुरा स्टेशनरी र अन्य
फर्म, कम्पनी र आपूर्तिकर्ता बाट जम्मा
रु १५४३७४० ।

इन्धन खरिद र डोजर मर्मत

- ▶ विनियोजन रकम रु ८००००००० र २०००००००।

लान्द्रक पेट्रोलियम, मुस्ताड फयल टेर्डस र चन्द्र सुर्य आयल स्टोर बाट डिजेल खरिद: रु ६९६८०००।

डोजर मर्मत डाइनामिक हेभि इक्युपमेन्ट प्रा लि रु ५३९३४९

सोलार सिस्टम:

▶ विनियोजन रकम रु
१००००००० ।

कर्णाली इनर्जी एण्ड स्टेशनरी
बाट खरिद भएको रु
८६७९०० ।

उपाध्यक्ष सँग बालवालिका कार्यक्रमः

► विनियोजन भएको रकम रु
५०००००।

चन्द्रशेखर प्रोडक्सन हाउस बाट खरिद
भएको रु ५००४३२।

२२० पिस स्कूल ब्याग प्रिन्ट सहित

फर्निचर एण्ड फिक्चर्स

▶ विनियोजन भएको रकम रु
१००००००।

सन्तोषी काष्ठ उद्योग बाट खरिदः
७७४६१५

मेसिनरी औजार र डिजीटल बोर्ड

► विनियोजन रकम रु १३०००००।

मेसिनरी सामान निसान कम्प्युटर टेर्डस
बाट खरिद: रु

१०४४३०२।

डिजीटल बोर्ड खरिद आउटलुक सप्लयार्स
बाट खरिद: रु २२७००१।

विपद व्यवस्थापन सामान खरिदः

► विनियोजन रकम रु ७०००००० ।

आउटलुक सप्लायर्स बाट खरिद भएको
रु ५३०९५३.८६ ।

भ्याकहो लोडर खरिद

▶ विनियोजन भएको रकम रु
६०००००० ।

स्यानो इन्टरनेशनला प्रा लि बाट खरिद
भएको रु ५९९५००० ।

विविध तर्फ

जे पी जनरल एण्ड सप्लायर्समा भुक्तानी भएको रकम रु २५६०००।

छार्का स्वास्थ्य चौकि ढाँडगाउँ र अन्य विभिन्न कार्यक्रमको लागि सामान आपूर्ति भएको

छपाई तर्फ

▶ विनियोजन भएको रकम रु
५०००००।

भूसाल अफसेटमा भुक्तानी रकम रु
२१८९१८।

हिमाली सुस्केरामा भुक्तानी भएको रकम
रु ३१६४०।

सामाना गरिएका समस्याहरु

- ▶ सिलिपबाट सामानको आपूर्ति भएको
- ▶ सामान खरिदको प्रक्रिया सबै कार्यालयले गर्नु पर्ने
- ▶ भौगोलिक विकटताले भने जस्तो र सोचे जस्तो सामानहरु आपूर्ति गर्न नसकिएको
- ▶ सामानहरु ढुवानी गर्न गाह्रो भएको
- ▶ आपूर्ति प्रायः एउटै फर्म बाट भएको

समाधानका उपायहरू

- ▶ आवश्यक प्रक्रिया पुर्याई मात्र सामानहरू खरिद गर्ने
- ▶ आपूर्तिकर्तालाई समयमानै फर्म सूचिकृत गर्न लगाउने
- ▶ कार्यालयको लागि आवश्यक सामानहरू खरिद गर्दा पनि सूचना प्रकाशन गरी प्रतिस्पर्धा गराई सामानको आपूर्ति गर्ने
- ▶ खरिद कार्य लाई एकद्वार प्रणालीमा लिने
- ▶ सार्वजनिक खरिद इकाई समितिको निर्णय पश्चात मात्र सामानहरू खरिद गर्ने

सम्पादन गरिएका अभ्यासहरू

- ▶ सामानहरूको आपूर्ति पश्चात सबै फर्महरूलाई पार्टी पेमेन्ट भएको
- ▶ कार्यालय र शाखाहरूको लागि अति आवश्यक सामानहरू मात्र खरिद गरिएको
- ▶ नखप्ने सामान र खप्ने सामानको पहिचान गरी वर्गीकरण गरिएको

के ही गुनासो र सुझाव भए
प्रश्नको अपेक्षा.....

समाप्त



ito.chharkatangsong.gov.np@gmail.com
info@chharkatangsongmun.gov.np

छार्का ताडसोड गाउँपालिका
ཇཱ་ཁ་ར་ཏ་ས་གྲོང་ཁྱེར་རྫོང་ཁུངས་ལུ་བཙུགས་པའི་
Chharka Tangsong Rural Municipality
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
कागकोट, डोल्पा



कर्णाली प्रदेश, नेपाल

आ व २०८०।०८१ को कार्यक्रमहरुको
वार्षिक समिक्षा गोष्ठी
मिति: २०८१ भाद्र ५ र ६ गते
स्थान: कागकोट, डोल्पा

प्रस्तुतकर्ता: मणिराज पौडेल
पद: योजना अनुगमन तथा तथ्याङ्क
शाखा प्रमुख

नमस्कार

१

कार्यक्रम: छार्का भेरी नदी तटबन्धन

स्थान: वडा नं १ छार्का

विनियोजन: १५०००००००

भुक्तानी: ५६०००७६।७०

प्रगति: ७५.६०%

२

कार्यक्रम: १ नं वडा कार्यालय भवन निर्माण

स्थान: वडा नं १ छार्का

विनियोजन: ५००००००

भुक्तानी: ३८७२७१८।७६

प्रगति: ९९.९४%

3

कार्यक्रम: कागकोट देखि भारबुङ सडक निर्माण

स्थान: वडा नं ४

विनियोजन: १५०००००००

भुक्तानी: १७३५१०२।४१

प्रगति: ३१.५२%

४

कार्यक्रम: कागकोट भेरी नदी तटबन्धन निर्माण

स्थान: वडा नं ४

विनियोजन: १०००००००

भुक्तानी: २६४५६६०।६४

प्रगति: ६१.८८%

५

कार्यक्रम: आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भवन
निर्माण

स्थान: वडा नं ५ घेराडः

विनियोजन: ५००००००

भुक्तानी: ३६९७४९७।२६

प्रगति: ९९.५८%

६

कार्यक्रम: फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि डम्पिङ्ग
साईट निर्माण

स्थान: वडा नं ४

विनियोजन: ९०००००००

भुक्तानी: २४२७९०२।७२

प्रगति: ५७.५०%

७

कार्यक्रमः गाउँपालिका प्रशासकीय भवन निर्माण

स्थानः वडा नं ४

विनियोजनः बहुवर्षिय

भुक्तानीः १००००००० पेशकी

प्रगतिः चालु

८

कार्यक्रमः गाउँपालिका बाटो तटबन्धन निर्माण
योजना

स्थानः वडा नं २

विनियोजनः १५०००००००

भुक्तानीः ०

प्रगतिः ०

कैफियतः कालो सूचीमा राख्न सिफारीस

९

कार्यक्रम: नेउडदेखि लाप्ये सम्म सडक मर्मत

स्थान: वडा नं १ छार्का

विनियोजन: ४००००००

भुक्तानी: २०३८६०९।००

प्रगति: ५०.९७%

१०

कार्यक्रम: ठिमेरदेखि ढोस्यासम्म बाटो मर्मत

स्थान: वडा नं २

विनियोजन: ६५००००

भुक्तानी: ६०९१००।००

प्रगति: ९३.७१%

११

कार्यक्रम: चाडचुड खोला ग्याविन निर्माण

स्थान: वडा नं १ छार्का

विनियोजन: १५०००००

भुक्तानी: १४३११८४।

प्रगति: ९५.४१%

१२

कार्यक्रम: टालाडदेखि गापी डल्सोसम्म बाटो
मर्मत

स्थान: वडा नं ३

विनियोजन: ६५००००

भुक्तानी: ६१७२७९।

प्रगति: ९४.९७%

१३

कार्यक्रम: लाडगुकदेखि दुखुडसम्म कृषि सडक
निर्माण

स्थान: वडा नं १ छार्का

विनियोजन: ४००००००

भुक्तानी: २५२१७१०।००

प्रगति: ६३.०४%

१४

कार्यक्रम: जेष्ठ नागरिक कोरा निर्माण

स्थान: वडा नं १ छार्का

विनियोजन: ६५००००

भुक्तानी: ६०५७५०।००

प्रगति: ९३.१९%

१५

कार्यक्रम: काबु सिंचाई कूलो निर्माण

स्थान: वडा नं ४

विनियोजन: ६५००००

भुक्तानी: ६०७८००।

प्रगति: ९३.५१%

१६

कार्यक्रम: डाकलोवादेखि थैलाडजा मेरीसम्म गोरेटो
बाटो निर्माण

स्थान: वडा नं ५

विनियोजन: ६५००००

भुक्तानी: ६१२०००।००

प्रगति: ९४.१५%

१७

कार्यक्रम: चडखादेखि फोलुन देमीसम्म सडक
मर्मत

स्थान: वडा नं ६

विनियोजन: ६५००००

भुक्तानी: ६१२८००

प्रगति: ९४.२८%

१८

कार्यक्रम: वास प्लान निर्माण

स्थान: छार्का ताडसोड गाउँपालिका

विनियोजन: ६०००००

भुक्तानी: ६०००००

प्रगति: १००%

१९

कार्यक्रम: गाउँपालिका प्रोफाइल निर्माण

स्थान: छार्का ताडसोड गाउँपालिका

विनियोजन: ५०००००

भुक्तानी: ३९८०००

प्रगति: १००%

समस्याहरु

- कार्य प्रारम्भ पूर्व अनुगमन गर्न सकेनौं ।
- ठेकेदारले काम शुरु गर्न ढिलाई गरे ।
- १ योजनाको काम नै शुरु भएन । रकम फ्रिज
- भौगोलिक दूरी र मौसमका कारण समय समयमा गर्नुपर्ने अनुगमन गर्न समस्या परिरह्यो ।
- अनुगमन समिति को क्रियाशीलता आर्थिक वर्षको अन्त्य तिर मात्रै ।
- वडा स्तरिय अनुगमन समितिलाई पनि क्रियाशील गराउन सकेनौं ।

समाधानका उपायहरू

- कार्य प्रारम्भ पूर्व अनुगमन गरौं ।
- ठेकेदारलाई समय मै काम शुरु गर्न लगाऔं ।
- काम नगर्नेलाई कालो सूचीमा राख्न नडराऔं ।
- भौगोलिक दूरी र मौसमका कारण समय समयमा गर्नुपर्ने अनुगमन गर्न समय मिलाऔं ।
- अनुगमन समिति को क्रियाशीलता आर्थिक वर्ष भरि कायम राखौं ।
- वडा स्तरिय अनुगमन समितिलाई पनि क्रियाशील बनाऔं ।

असल अभ्यास


- काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारीस पहिलो पटक ।
- वडा कार्यालयको क्रियाशीलतामा अभिवृद्धि ।
- सेवा केन्द्रहरु विस्तारित हुँदैछन् ।

धन्यवाद ।

केही जिज्ञासा ?



छार्का ताडसोड गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
कागकोट, डोल्पा
कर्णाली प्रदेश, नेपाल




आ. व. २०८०/०८१ को वार्षिक समिक्षा गोष्ठी



बम बहादुर भण्डारी
पुर्वाधार विकास शाखा प्रमुख
छार्का ताडसोड गाउँपालिका कागकोट, डोल्पा
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

आ. व २०८०/८१ जम्मा योजनाहरु :१७




- गाउँपालिका उपभोक्ता समितिबाट जम्मा योजनाहरु
- ठेक्का बाट भएका योजनाहरु

आ.व २०८०-०८१ मा भएका कामहरु
योजनाहरु सम्बन्धित कामहरु
छार्का ताडसोड गाउँपालिका दुरि र सुचना बोड
छार्का ताडसोड गाउँपालिका दररेट २०८१-०८२
DPR and quotation

आ.व २०८०-०८१ मा भएका कामहरू


- योजनाहरू सम्बन्धित कामहरू
- छार्का ताडसोड गाउँपालिका दुरि र सुचना बोड
- छार्का ताडसोड गाउँपालिका दररेट २०८१-०८२
- DPR and quotation

विनियोजित बजेट रु

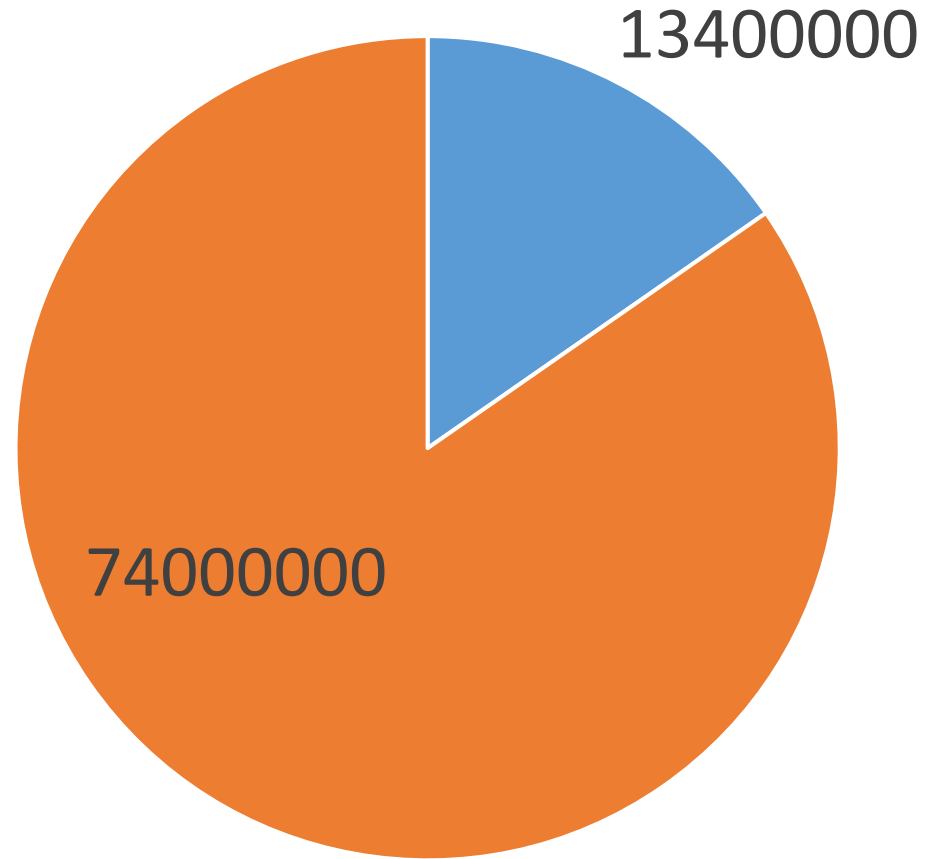


- गाउँपालिका बाट उपभोक्ता समितिबाट काम भएका योजनाहरु
- समपुरक, विशेष अनुदान, शसर्त अनुदान प्रदेश सरकार र संघ सरकार ठेक्काबाट काम भएका योजनाहरु

भौतिक पुर्वाधारमा विनियोजित बजेट र भुक्तानी रकम रु

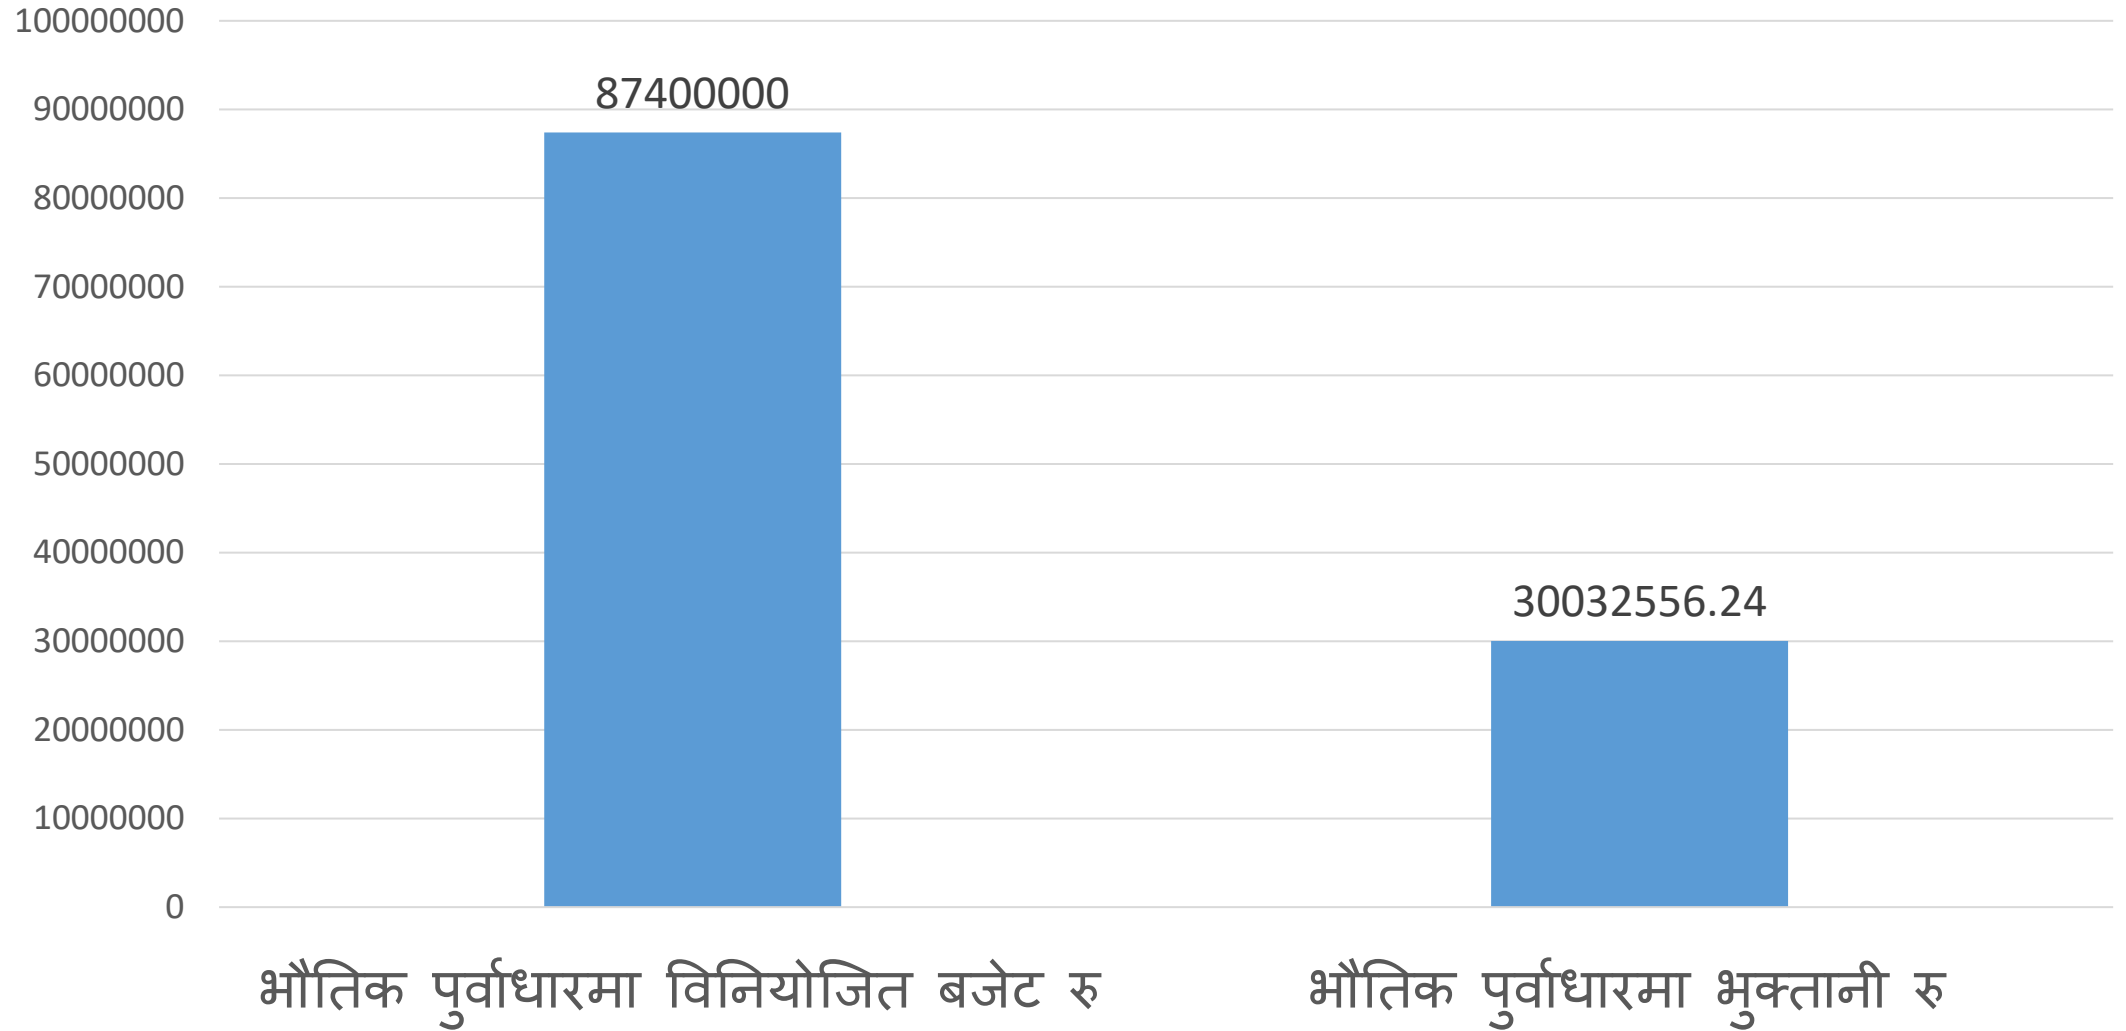


भौतिक प्रगति

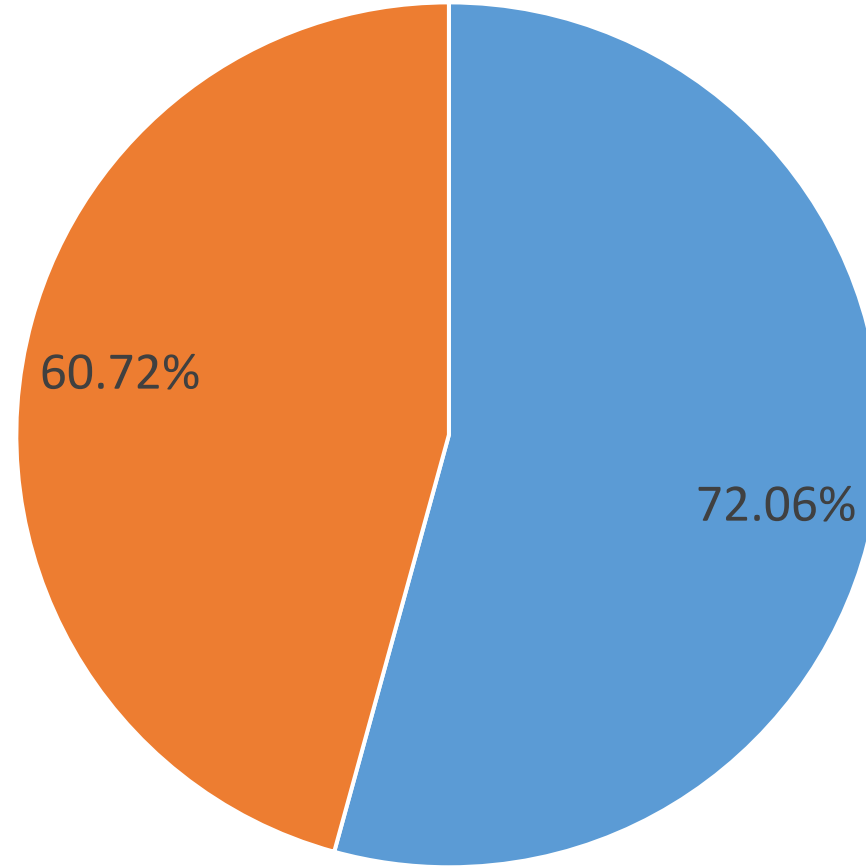


- गाउँपालिका बाट उपभोक्ता समितिबाट काम भएका योजनाहरु
- सम्पुरक, विशेष अनुदान, शस्र्त अनुदान प्रदेश सरकार र संघ सरकार ठेक्काबाट काम भएका योजनाहरु


विनियोजित बजेट र भुक्तानी रकम रु

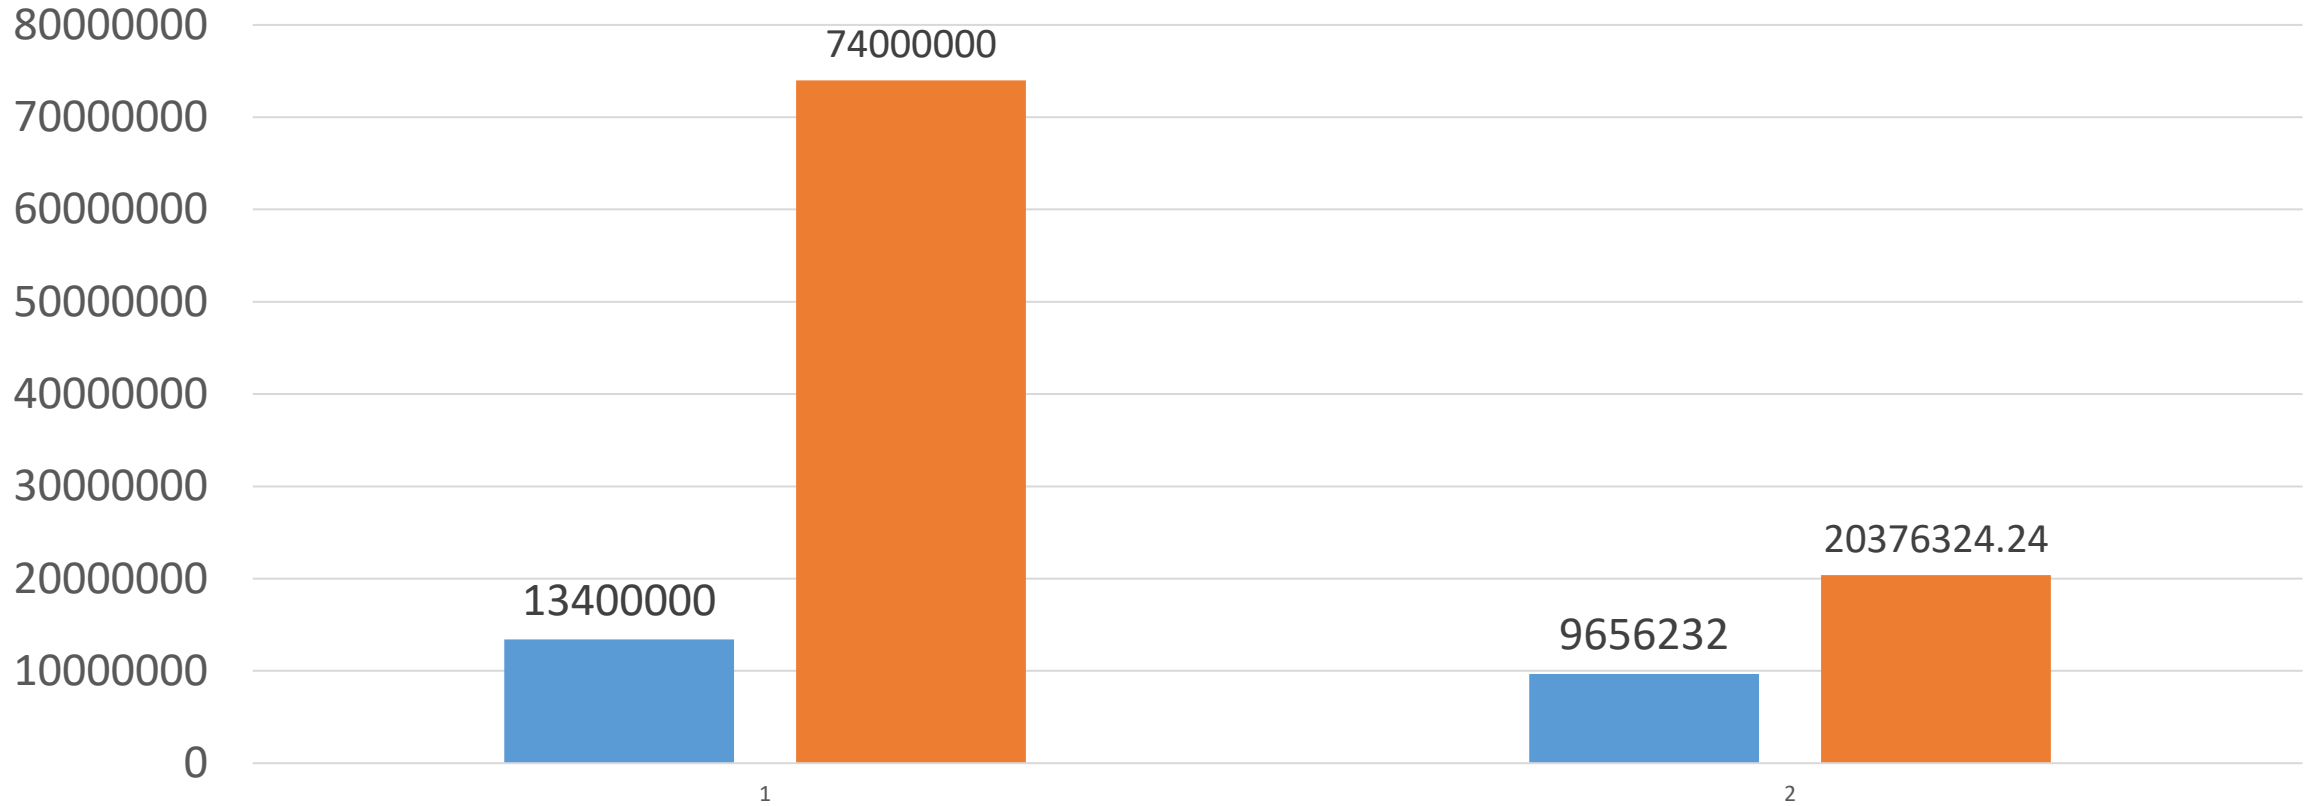

- गाउँपालिका बाट उपभोक्ता समितिबाट काम भएका योजनाहरु
- सम्पुरक, विशेष अनुदान, शर्त अनुदान प्रदेश सरकार र संघ सरकार ठेक्काबाट काम भएका योजनाहरु

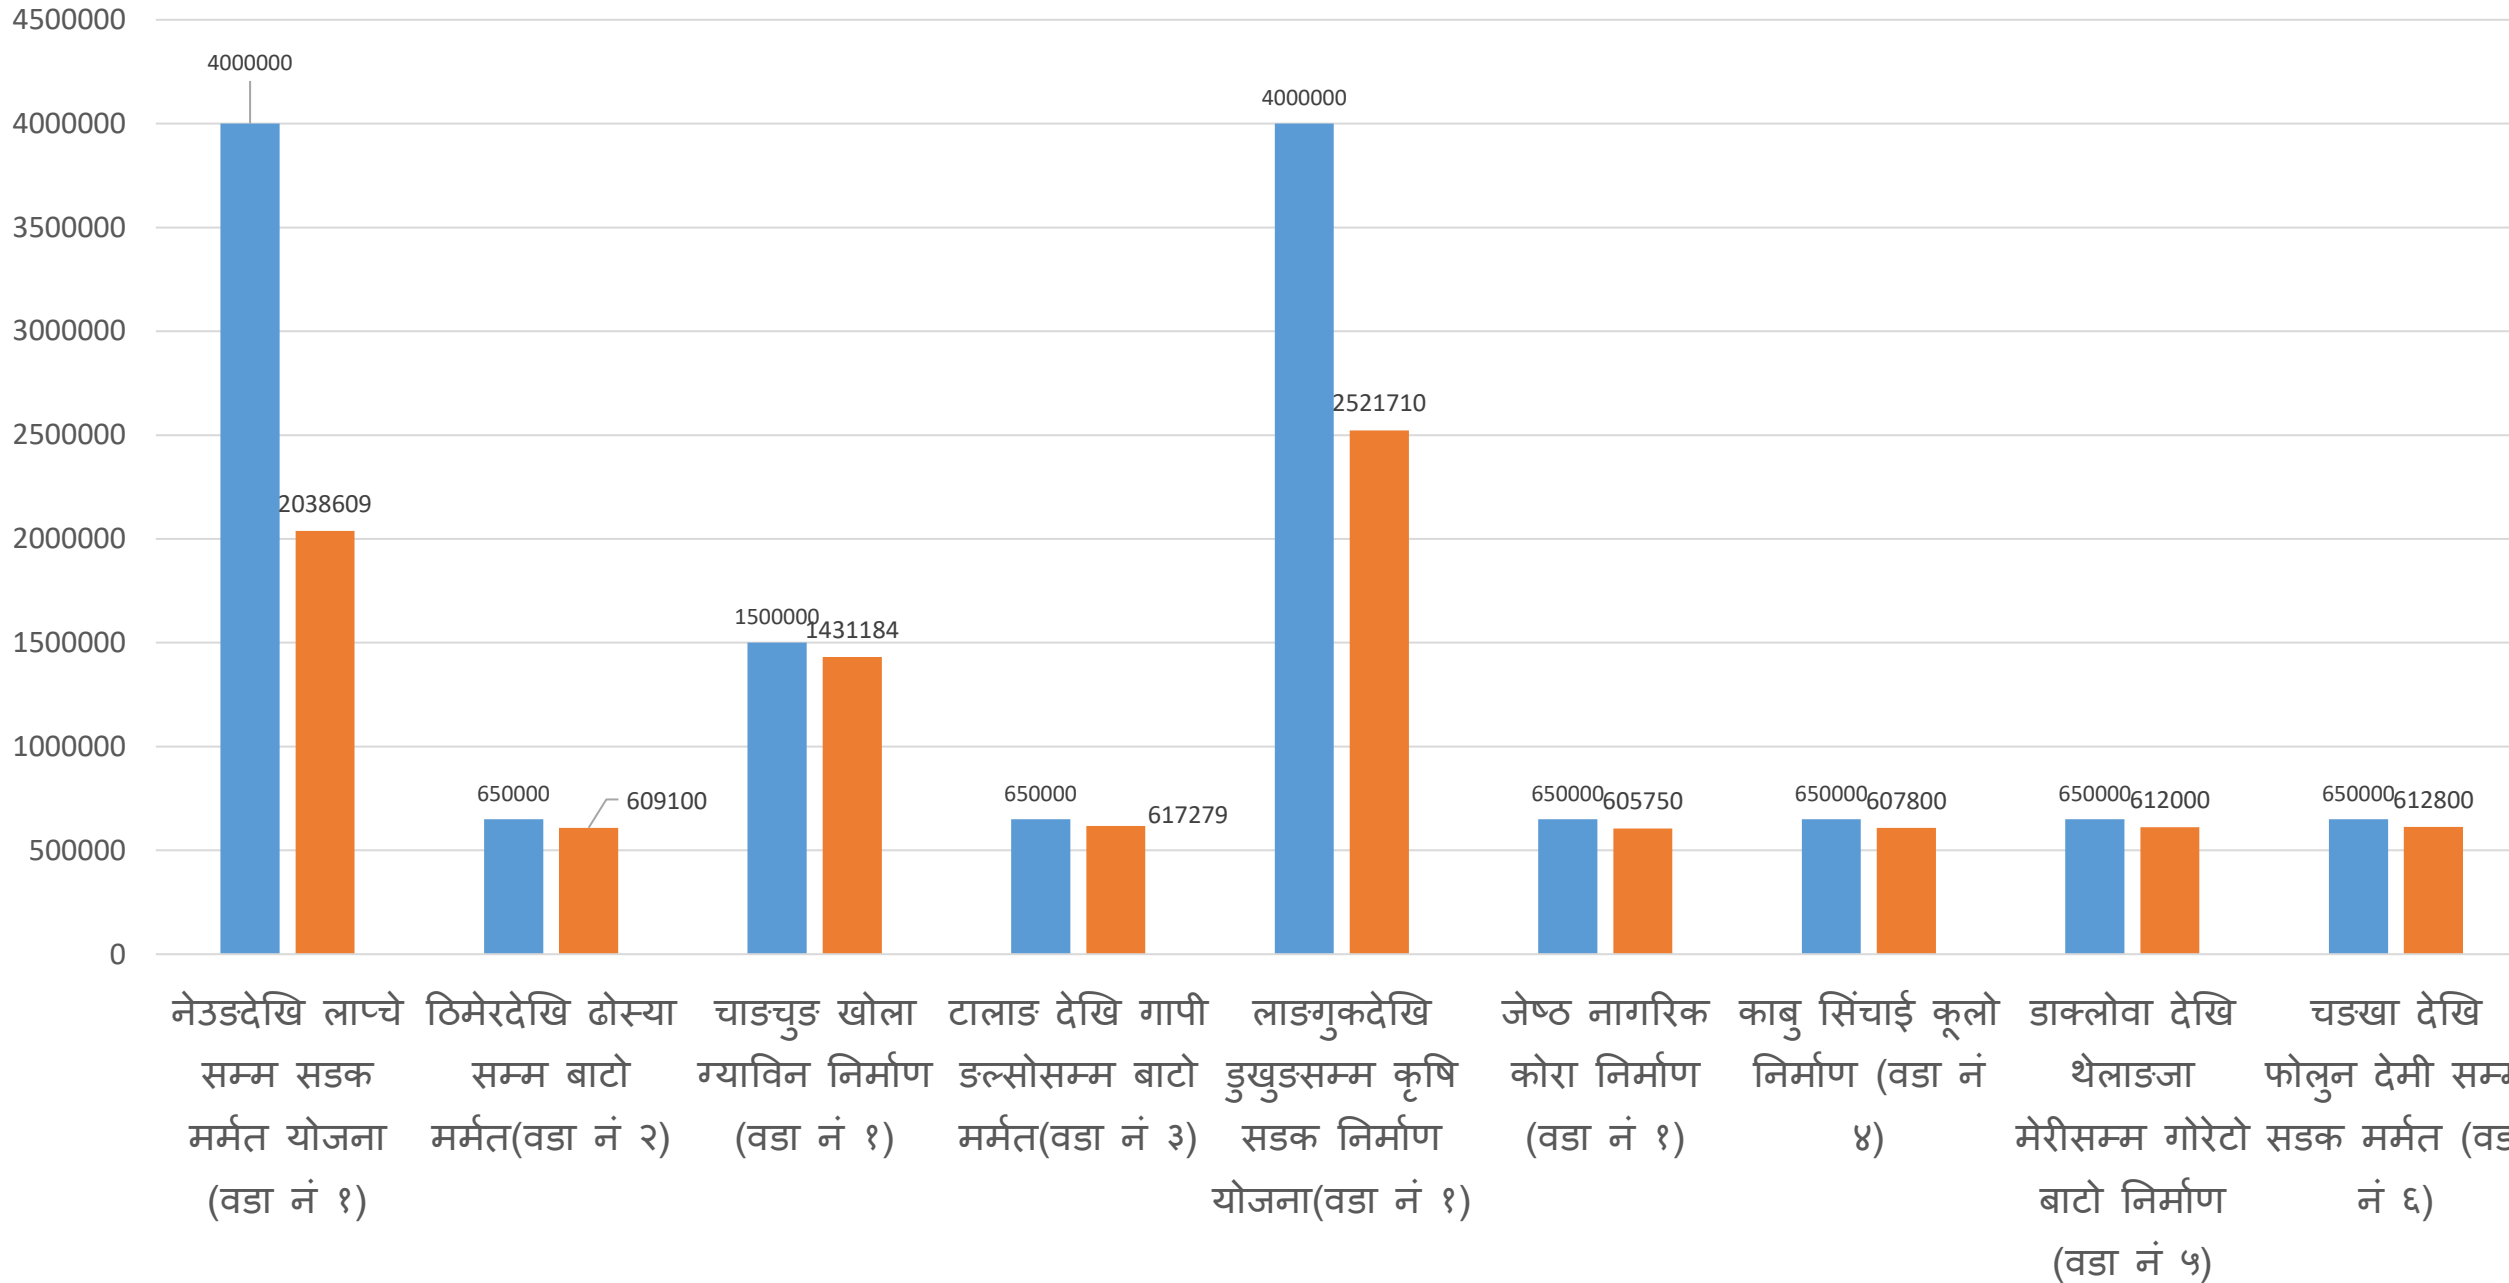

ठेक्कामा विनियोजित रकम र भुक्तानी रकम रू

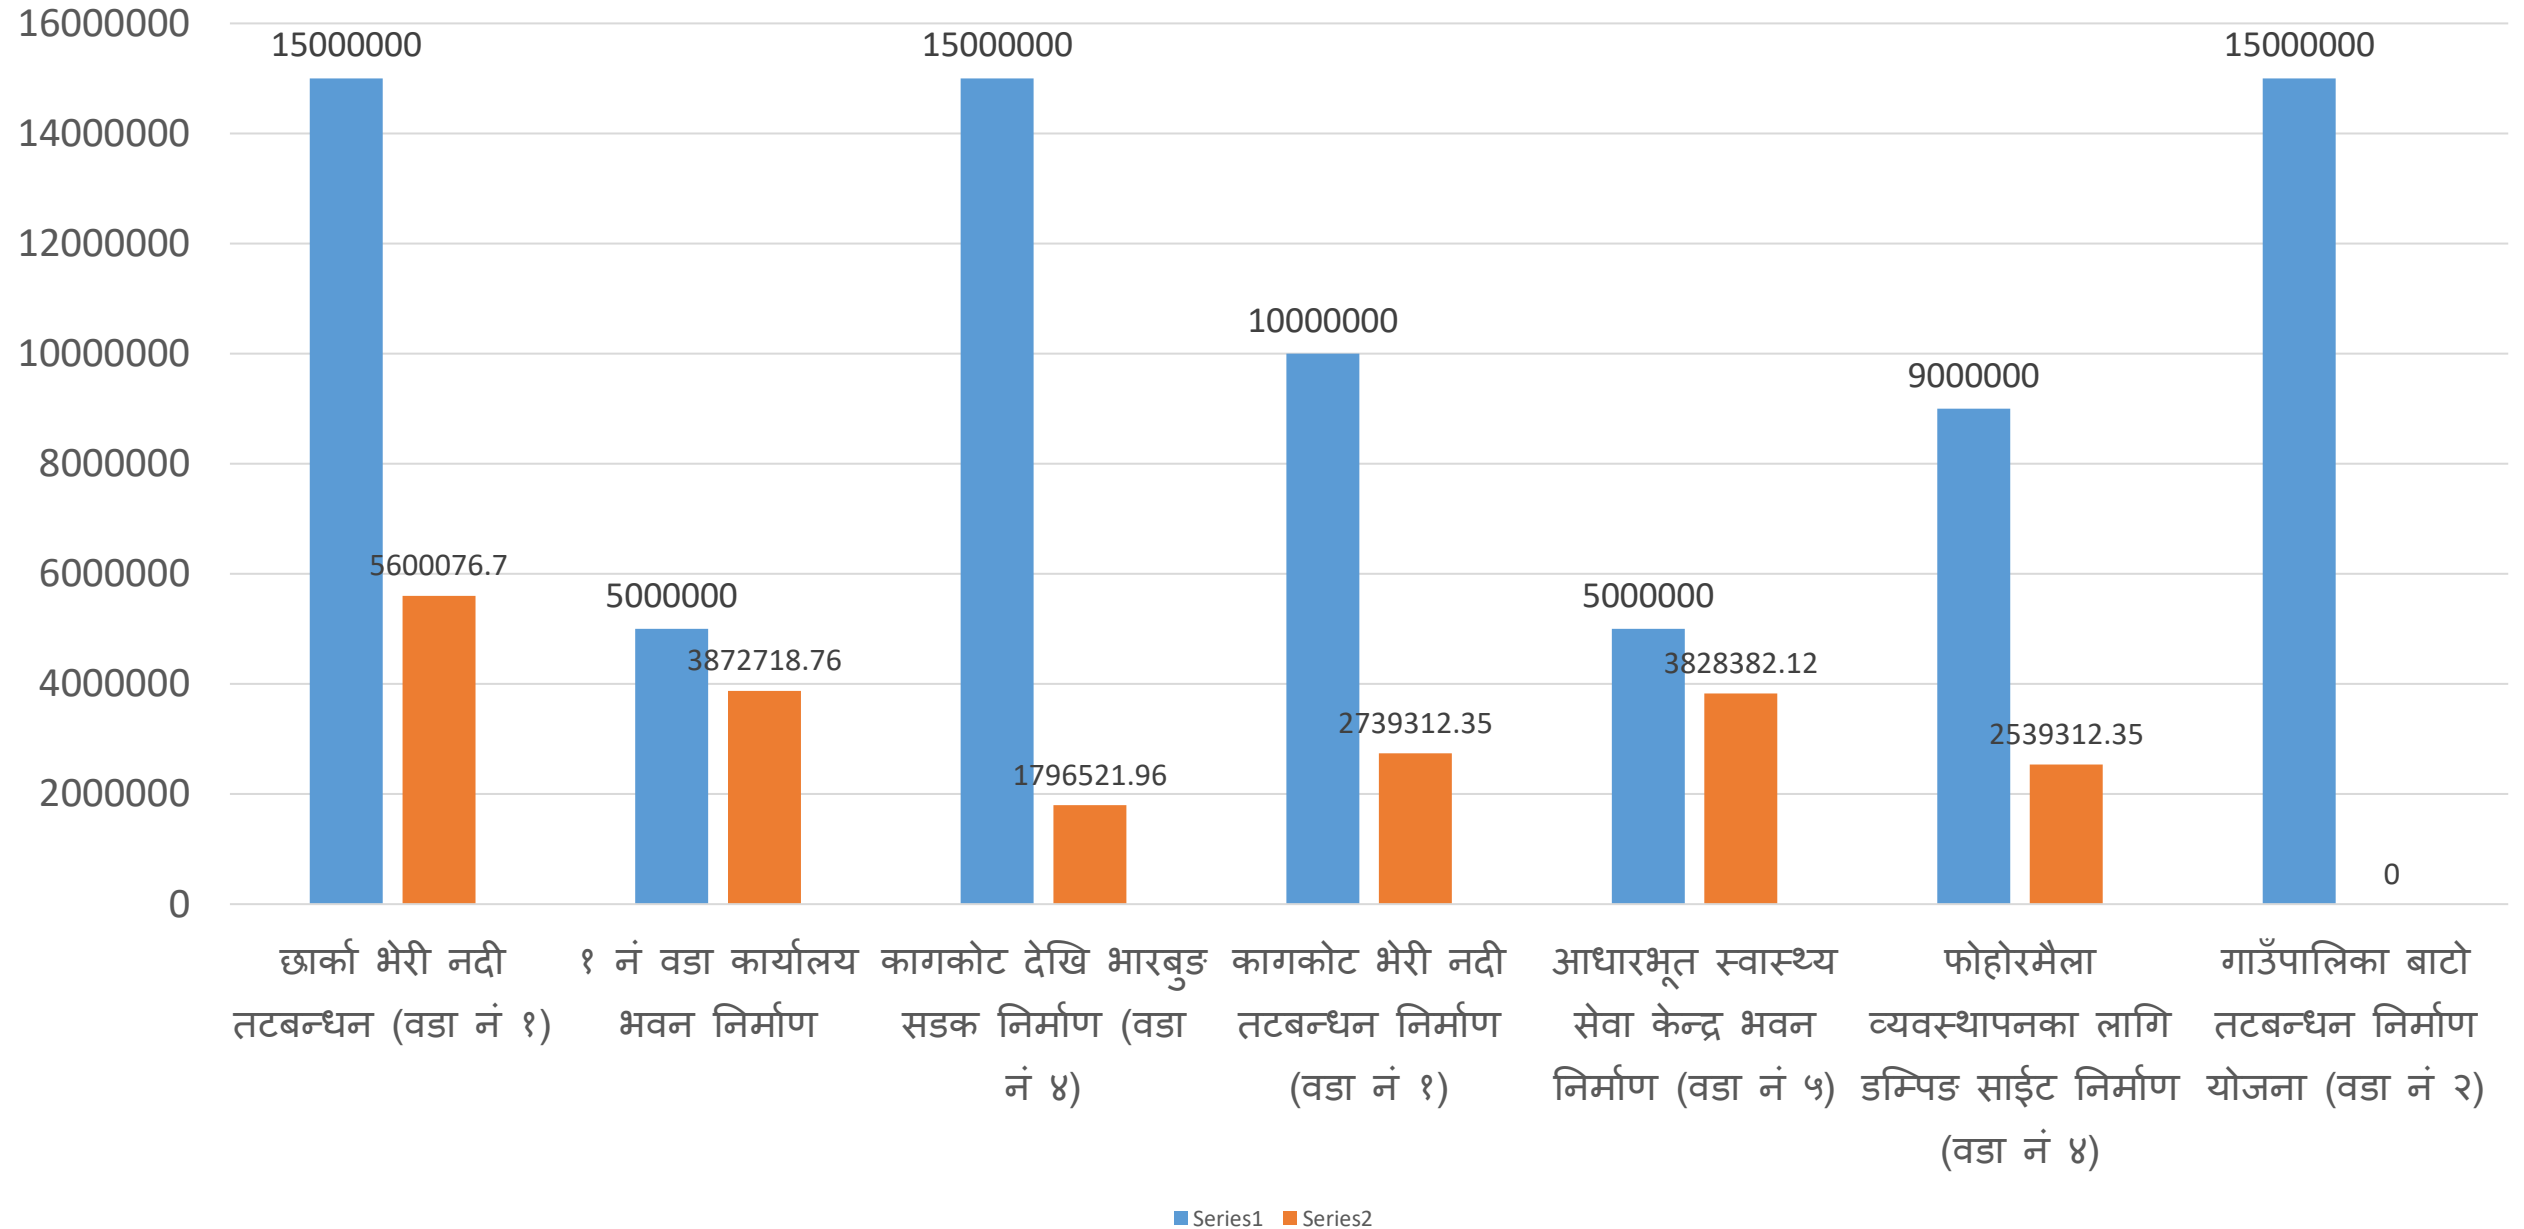

नेउडदेखि लाप्चे सम्म सडक मर्मत योजना (वडा नं १)



Before Construction

नेउडदेखि लाण्चे सम्म सडक मर्मत योजना (वडा नं १)



During construction

नेउडदेखि लापचे सम्म सडक मर्मत योजना (वडा नं १)



After construction

नेउडदेखि लाप्चे सम्म सडक मर्मत योजना (वडा नं १)



After construction

नेउडदेखि लाप्चे सम्म सडक मर्मत योजना (वडा नं १)



Measurement photo

लाडगुकदेखि डुखडसम्म कृषि सडक निर्माण योजना(वडा नं १)



Measurement Photo

लाडगुकदेखि डुखडसम्म कृषि सडक निर्माण योजना(वडा नं १)



Measurement photo

लाडगुकदेखि डुखडसम्म कृषि सडक निर्माण योजना(वडा नं १)



लाडगुकदेखि डुखडसम्म कृषि सडक निर्माण योजना(वडा नं १)



Rural municipality monitoring

लाडगुकदेखि डुखडसम्म कृषि सडक निर्माण योजना(वडा नं १)



Final construction

जेष्ठ नागरिक कोरा निर्माण (वडा नं १)



Final construction

१ नं वडा कार्यालय भवन निर्माण



During foundation construction

१ नं वडा कार्यालय भवन निर्माण



During wall , window , door construction

१ नं वडा कार्यालय भवन निर्माण



After construction

छार्का भेरी नदी तटबन्धन (वडा नं १)



Before Construction

छार्का भेरी नदी तटबन्धन (वडा नं १)



Before construction

छार्का भेरी नदी तटबन्धन (वडा नं १)



After construction

छार्का भेरी नदी तटबन्धन (वडा नं १)



After construction

चाडचुड खोला ग्याविन निर्माण (वडा नं १)



Before construction

चाडचुड खोला ग्याविन निर्माण (वडा नं १)



चाडचुड खोला ग्याविन निर्माण (वडा नं १)



After construction

ठिमेर देखी ढोस्या सम्म पदमार्ग मर्मत योजना (वडा नं 2)



After construction

ठिमेर देखी ढोस्या सम्म पदमार्ग मर्मत योजना (वडा नं 2)



After construction

ठिमेर देखी ढोस्या सम्म पदमार्ग मर्मत योजना (वडा नं 2)




After construction

कागकोट भेरी नदी तटबन्धन योजना (वडा नं 4)



During Construction

कागकोट भेरी नदी तटबन्धन योजना (वडा नं 4)

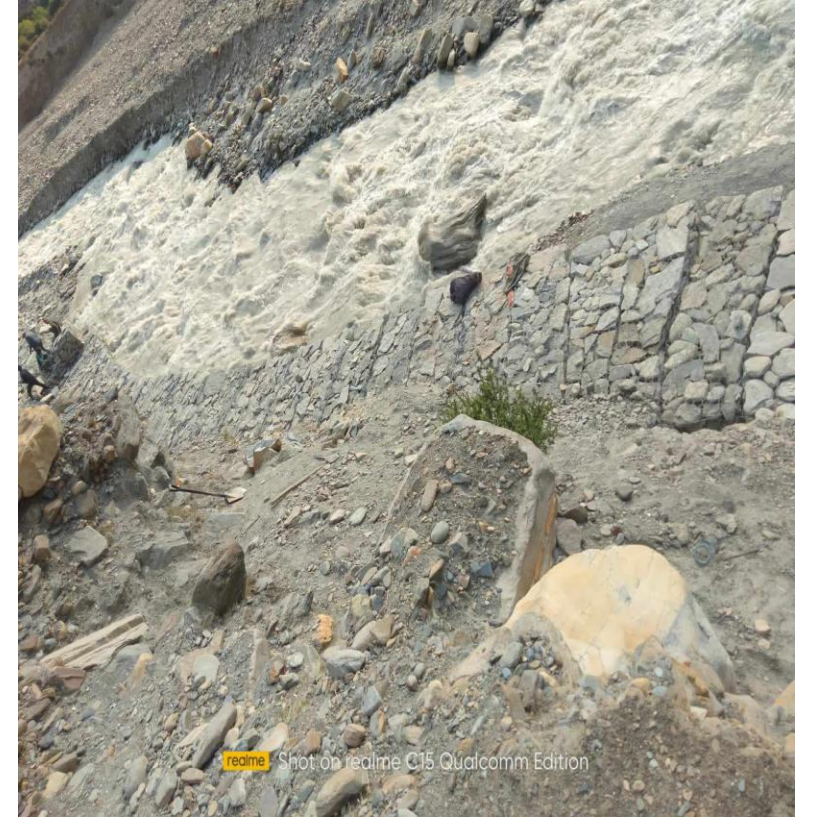


During Construction

कागकोट भेरी नदी तटबन्धन योजना (वडा नं ४)



कागकोट भेरी नदी तटबन्धन योजना (वडा नं 4)

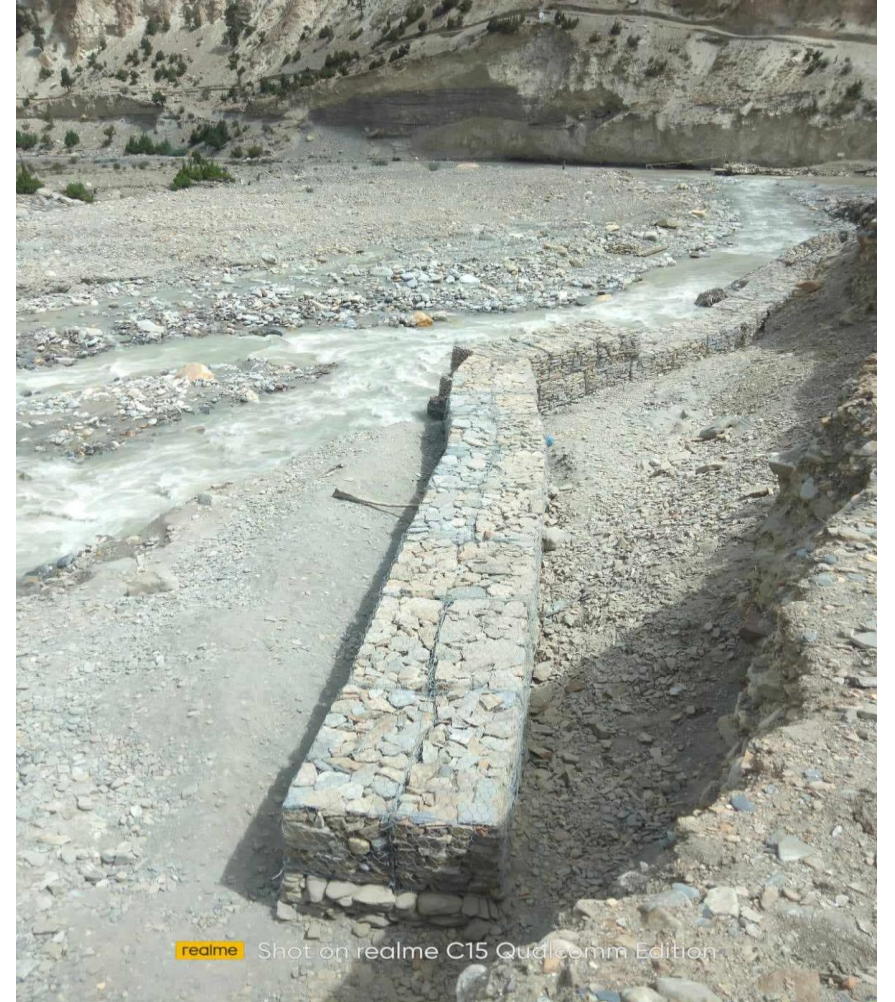

Final construction

कागकोट भेरी नदी तटबन्धन योजना (वडा नं 4)



Rural municipality monitoring team

कागकोट भेरी नदी तटबन्धन योजना (वडा नं 4)



Rural municipality monitoring team

फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि डम्पिङ साईट निर्माण (वडा नं ४)



During construction

फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि डम्पिङ साईट निर्माण (वडा नं ४)



फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि डम्पिङ साईट निर्माण (वडा नं ४)



During dumping site and sewage chamber construction

फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि डम्पिङ साईट निर्माण (वडा नं ४)



Final Damping site construction

कागकोट देखि भारबुङ सडक निर्माण (वडा नं ४)



Before Construction

कागकोट देखि भारबुङ सडक निर्माण (वडा नं ४)



Before construction

कागकोट देखि भारबुङ सडक निर्माण (वडा नं ४)



During construction

कागकोट देखि भारबुङ सडक निर्माण (वडा नं ४)



Final construction

कागकोट देखि भारबुङ सडक निर्माण (वडा नं ४)



Final construction

कागकोट देखि भारबुङ सडक निर्माण (वडा नं ४)



Rural municipality monitoring

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भवन निर्माण (वडा नं ५)



During construction

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भवन निर्माण (वडा नं ५)



During septic tank and boundary wall construction

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भवन निर्माण (वडा नं ५)



During construction

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भवन निर्माण (वडा नं ५)



After construction

गाउँपालिका स्तरीय अनुगमन फोटोहरु



गाउँपालिका स्तरीय अनुगमन जादा खिचेका फोटोहरु



Bidding document

GCC 34.3 The period between Program updates is **30 days**.

The amount to be withheld for late submission of an updated Program is.....Amount

GCC 55.1 The **liquidated damages for the whole of** the Works are **0.05 Percent of the final Contract Price per day**. The **maximum amount of liquidated damages for the whole of the Works is 10 Percent of the final Contract Price**.

GCC 56.1 The **Bonus for the whole of** the Works is **0.05 Percent per day**. The maximum amount of **Bonus for the whole of the Works is 10% of the final Contract Price**.

Bidding document

GCC 71.1 The date by which operating and maintenance manuals are required is; [Insert date]

GCC 71.2 The date by which —as built|| drawings are required is:[Insert date] The amount to be withheld for failing to produce —as built|| drawings and/or Operating and maintenance manuals is:[Insert Amount]

GCC 72.3 (i) The maximum number of days is: 200

Bidding document

72. Termination

72.1 The Employer may terminate the Contract at any time if the contractor;

- a. does not commence the work as per the Contract,
- b. abandons the work without completing,
- c. fails to achieve progress as per the Contract.

72.2 The Employer or the Contractor may terminate the Contract if the other party causes a fundamental breach of the Contract.

72.3 Fundamental breaches of Contract shall include, but shall not be limited to, the following :

- (a) The Contractor uses the advance payment for matters other than the contractual obligations,
- (b) the Contractor stops work for **30 days when no stoppage of work** is shown on the current Program and the stoppage has not been authorized by the Project Manager;
- (c) the Project Manager instructs the **Contractor to delay the progress of the Works**, and the instruction is **not withdrawn within 30 days**;

Bidding document

74. Black Listing

74.1 Without prejudice to any other rights of the Employer under this Contract, GoN, Public Procurement Monitoring Office (PPMO), on the recommendation of procuring entity, may blacklist a Bidder for its conduct for **a period of one (1) to three (3) years** on the following grounds and seriousness of the act committed by the bidder:

- (a) if it is established that the Contractor has committed substantial defect in implementation of the contract or has not substantially fulfilled its obligations under the contract or the **completed work is not of the specified quality as per the contract.**
- (b) If convicted from a **court of law in a criminal offense liable to be disqualified** for taking part in procurement contract,
- (c) If it is established that the Contractor has engaged **in corrupt or fraudulent practices** in competing for or in executing the Contract.

Why delay construction project in Chharka Tangsong rural municipality

- inadequate planning.
- design changes
- low bidding of contracts,
- unrealistic contract durations
- lack of construction materials, equipment, and manpower.
- lack of coordination among team members,
- weak monitoring
- poor site conditions
- variation of quantities during project
- political issues, climate change and budget allocation
- Insufficient management direction**
- A poor risk management**

Solution of delay construction project in Chharka Tangsong rural municipality

- adequate planning.
- adequate design
- Control bidding of contracts,
- unrealistic contract durations
- Proper of construction materials, equipment, and manpower.
- proper of coordination among team members,
- Time to time monitoring
- variation of quantities during project
- sufficient management direction**

Client ,Consultant and contract Relationships

3 Client / Consultant Relationships

Relationship #1




Relationship #2




Relationship #3



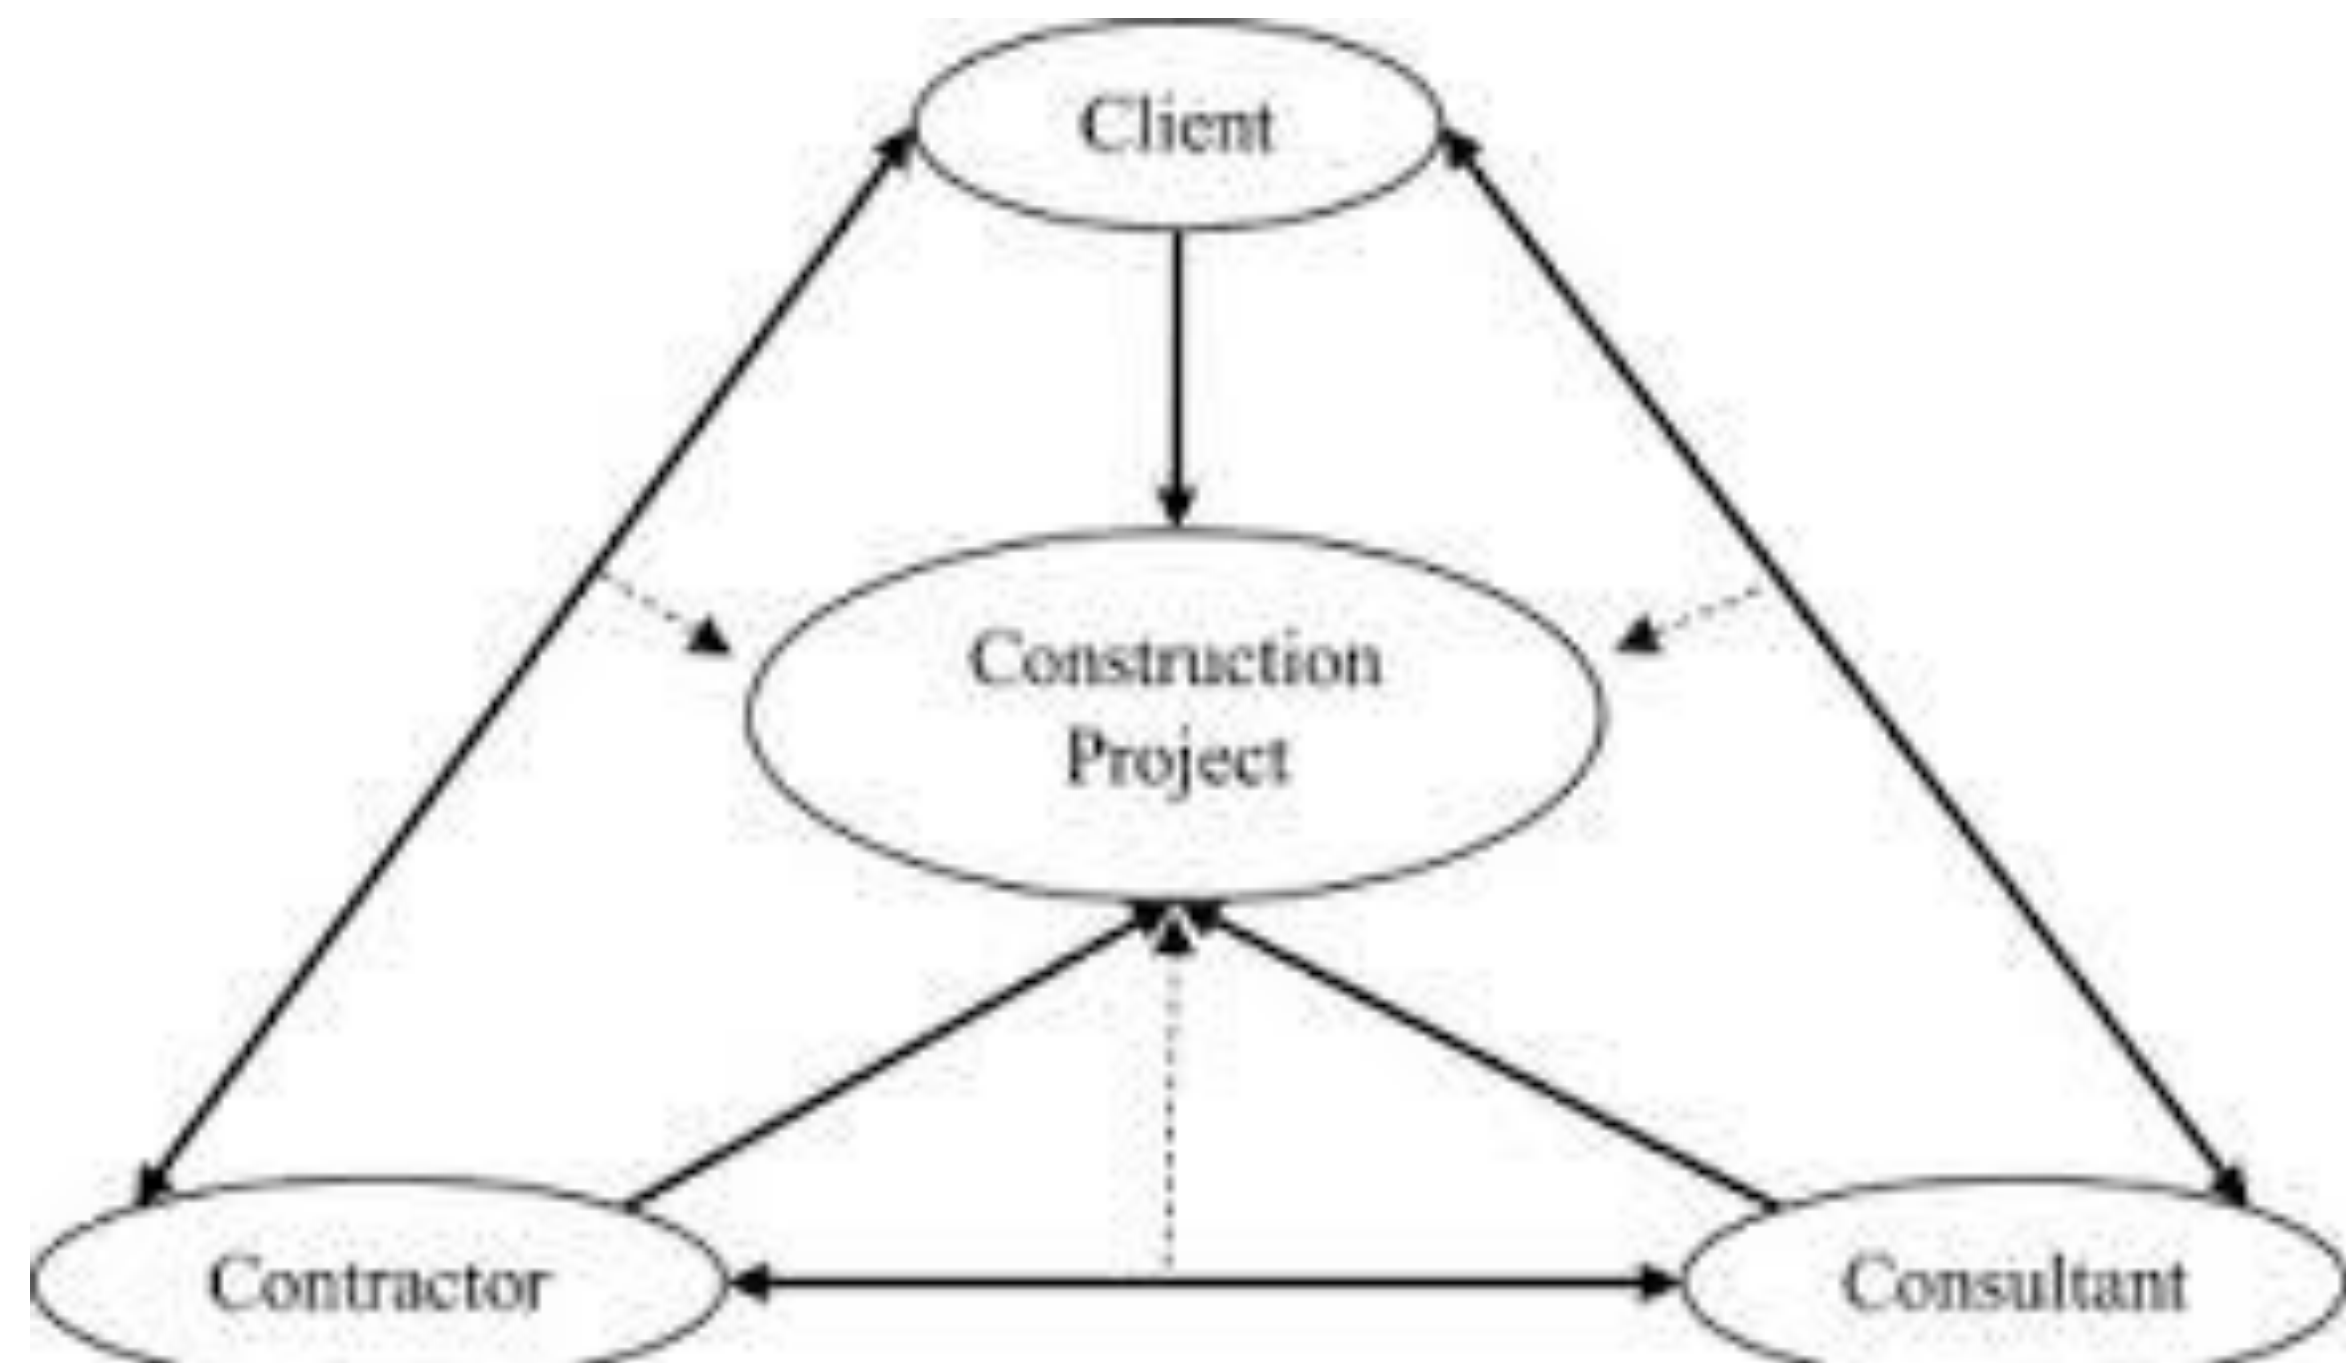

व २०८१/०८२ ठेक्का सम्बन्धी जम्मा योजनाहरु :३

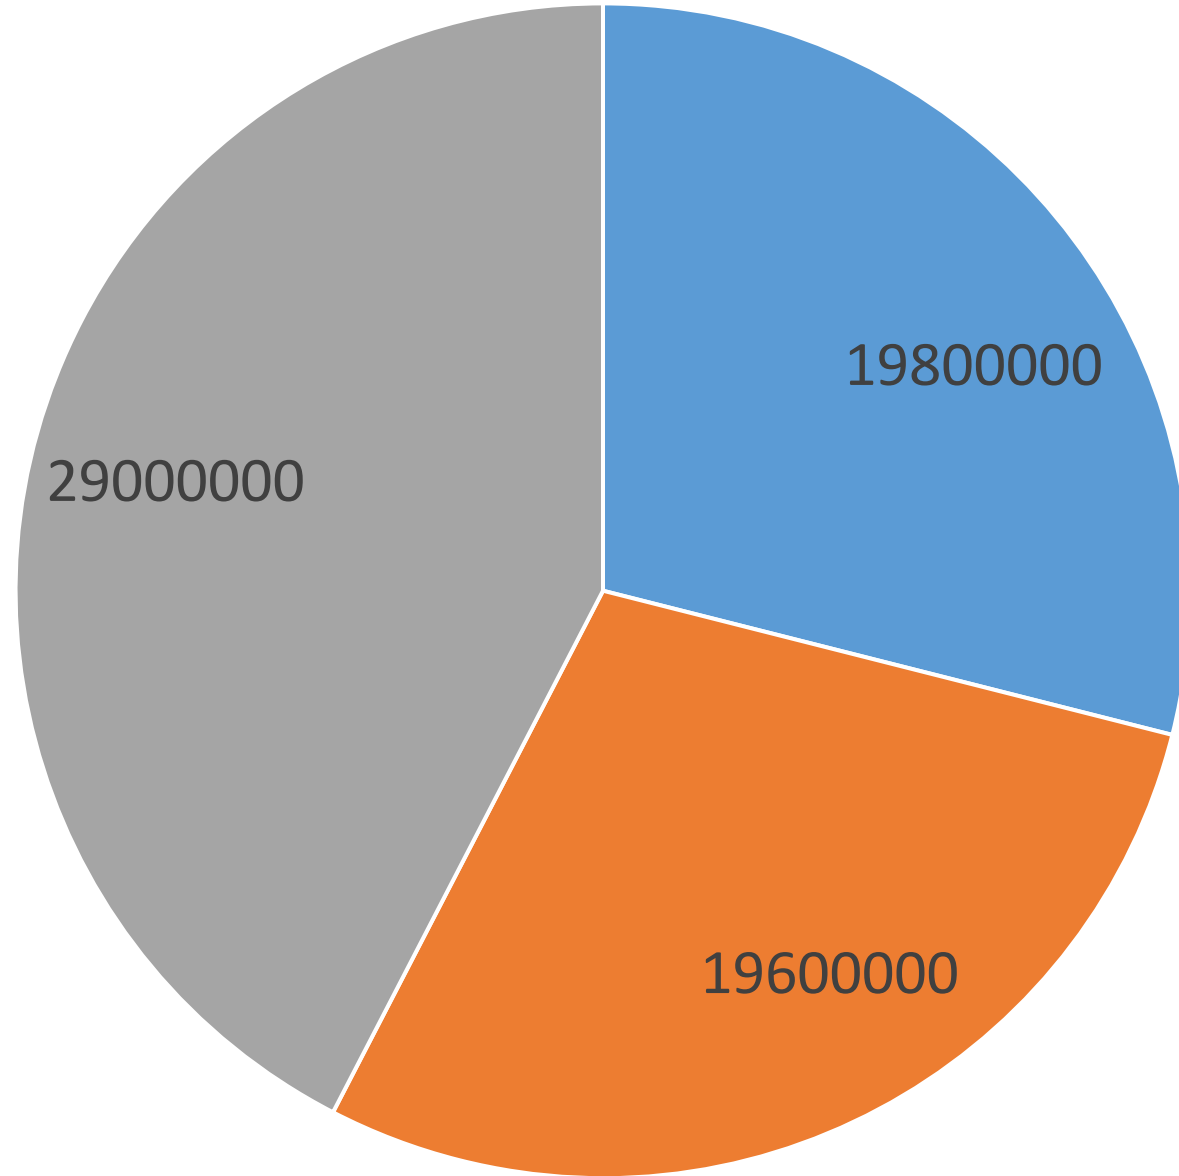

कार्य शैरी गरी सम्बन्धन (वडा नं. १)

सामग्री शैरी गरी सम्बन्धन निर्माण (वडा नं. १)

Proposed Construction project schedule

Name of project: Chharka Bheri Nadi Tatbandh Nirman yojana

Location of project: Chharka Tangsong rural municipality-1, Dolpa

Projective actives	B.S ,2081,Bharda to Kartika (weeks)				B.S ,2081,magsir to Falgun (weeks)				B.s 2081 Chaitra to B.S 2082 Asar(Weeks)			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Estimate ,Preparation bidding document , e-bidding , contract selection , contract agreement and work orders												
Transportation of gabion mesh weir in to proposed location												
Fabrication of gabion boxes including rolling, cutting and weaving												
Gabion foundation construction and placing , filling rock												
Gabion backfilling and finishing												
R.M monitoring plan and measurement work												
Final bill and Official payment process												

Proposed Construction project schedule

Name of project: Kagkot Bheri Nadi Tatbandh Nirman yojana

Location of project: Chharka Tangsong rural municipality-1, Dolpa

Projective actives	B.S ,2081,Bharda to Kartika (weeks)				B.S ,2081,magsir to Falgun (weeks)				B.s 2081 Chaitra to B.S 2082 Asar(Weeks)			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Estimate ,Preparation bidding document , e-bidding , contract selection , contract agreement and work orders												
Transportation of gabion mesh weir in to proposed location												
Fabrication of gabion boxes including rolling, cutting and weaving												
Gabion foundation construction and placing , filling rock												
Gabion backfilling and finishing												
R.M monitoring plan and measurement work												
Final bill and Official payment process												

केहि प्रश्नहरु र सुझावहरु

विद्यायाः
